



ООО «ФАЕРНЕТ»
123298, г. Москва, ул. Маршала Новикова д.15, помещение 4.
ИНН/КПП 7704575784/773401001
E-mail: lav01@yandex.ru
Тел./факс: 8-499-252-08-29, тел.: 8-916-980-61-68

Заказчик: АО «МТУ Сатурн»

**Объект: Здание по адресу: г.Москва, ул. Большая Черкизовская,
дом 21, стр.1**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Москва 2025 г



ООО «ФАЕРНЕТ»
123298, г. Москва, ул. Маршала Новикова д.15, помещение 4.
ИНН/КПП 7704575784/773401001
E-mail: lav01@yandex.ru
Тел./факс: 8-499-252-08-29, тел.: 8-916-980-61-68

Заказчик: АО «МТУ Сатурн»

Объект: Здание по адресу: г.Москва, ул. Большая Черкизовская, дом 21, стр.1

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Взам. Инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Генеральный директор



А.В. Ли




Главный инженер проекта


П.С. Корецкий

Москва 2025 г.

Общая часть
Порядок производства работ

- Демонтировать (разобрать) перегородки, полы, подвесные и черновые потолки.
 - Для демонтажа аварийных перемычек в уровне потолка первого этажа в осях 2-5,Б и 2-5,В необходимо установить телескопические стойки с несущей способностью 750 кг.
 - Собрать сплошной настил на отметке +2 м на всю длину конструкций. Поэлементно разобрать кладку, начиная с разрушенной части.
- Примыкание перемычек к колоннам срезать, при этом сохранить размеры колонн до уровня потолка.
- Все основные и второстепенные балки перекрытия первого этажа очистить от грязи, обеспылить и обработать антисептиком глубокого проникновения.
- Установка каких-либо крепёжных элементов в теле балок запрещается.
- Все крепления проводить через верх балок.
- Выполнить изоляцию потолка минеральной ватой толщиной 50 мм. Согласовать со службой режима контур решеток и выполнить их указания. Выполнить каркас подвесных потолков и разводку коммуникаций,
 - Очистить стены и колонны от плохо закреплённой штукатурки, заделать трещины в стенах и колоннах, подготовить ниши для радиаторов
 - Восстановить штукатурку несущих стен и колонн на всю высоту, за исключением нижней полосы 150 мм.
 - Очистить от штукатурки и оштукатурить полосу до отметки +0,15 по стенам и колоннам.
 - Определить уровень нулевой отметки.
 - Очистить от пыли, оштукатурить и обработать бетоноконтактом, выполнить выравнивающую стяжку согласно схемы.
 - Оштукатурить остальную часть перекрытия, уложить настил, армировать, бетонировать и отшлифовать пол.
 - Возобновить работу возможно при достижении бетона 50% прочности.

						Заказчик: АО "МТУ Сатурн" АР			
						Объект: Здание по адресу: г.Москва, ул. Большая Черкизовская, дом 21, стр.1			
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Помещение в рядах А-Г, оси 1-5	Стадия	Лист	Листов
Директор		ЛИ А.В.					П		
ГИП		Корецкий П.С.							
Конструк.		Савинов А.Е.				Общая часть	ООО "Фаернет"		

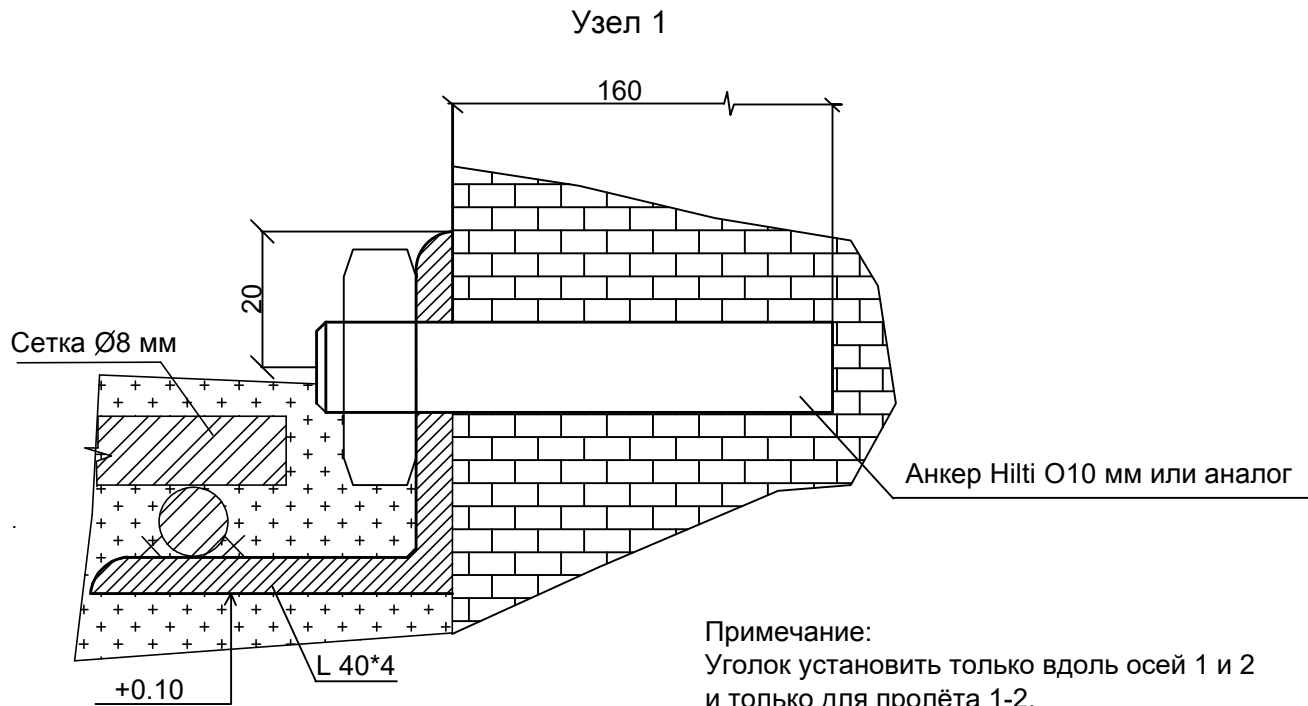

Примечание:
 Уголок установить только вдоль осей 1 и 2
 и только для пролёта 1-2.
 Анкера установить с шагом - 400 мм.

Спецификация					
Марка поз.	Обозначение	Наименование	Един. измер.	Кол-во	Примечание
H1		H75-800-0,7	м.квадр.	200	
C1		в составе:			
O1		Ø 12AIII	м.п.	1260	
O2		Ø 8AIII	м.п.	950	
O3		Ø 6A I	м.п.	250	
C2		Сетка Ø 8AIII $\frac{100}{100}$	м.квадр.	200	
		Бетон кл. В25	м.кубич.	20	

					Заказчик: АО "МТУ Сатурн" КР				
					Объект: Здание по адресу: г.Москва, ул. Большая Черкизовская, дом 21, стр.1				
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Помещение в рядах А-Г, оси 1-5	Стадия	Лист	Листов
Директор		ЛИ А.В.					П		
ГИП		Корецкий П.С.							
Конструк.		Савинов А.Е.				Узел 1 Спецификация	ООО "Фаернет"		
